

(仮称)国分寺駅北口地下自転車駐車場整備工事

工事進捗説明会

発注者:国分寺市


工事監理者:八千代エンジニアリング株式会社

工事施工者:村本・多摩ふるさと建設共同企業体

工事概要

地下自転車駐車場

- ① 全体を**2分割**で施工(南側を1工区、北側を2工区)
- ② **1工区**施工時は、再開発ビル直結の地下連絡通路及び西側斜路付階段を同時に施工
- ③ **2工区**施工時は、北側斜路付階段を同時に施工

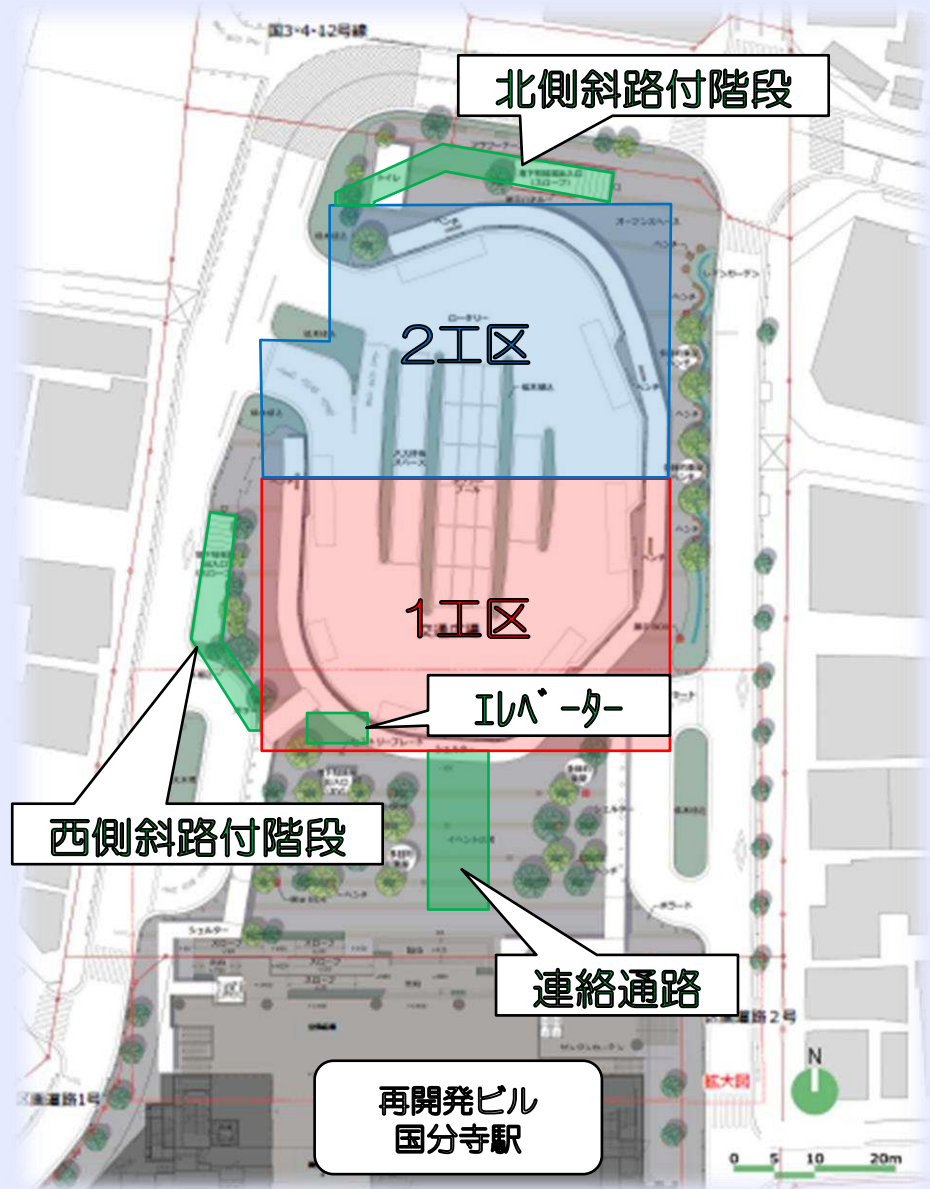

進捗施工フロー

1工区施工(昼間施工)


- 躯体工事、埋め戻し工事完了
- 現在地下内部の仕上げ工事施工中

1工区施工(夜間施工)


- 連絡通路部舗装復旧工事
- 給排水設備工事
(1週間程の施工を予定)

2工区施工(昼間施工)

- 山留め工事、掘削工事完了
- 現在躯体工事施工中

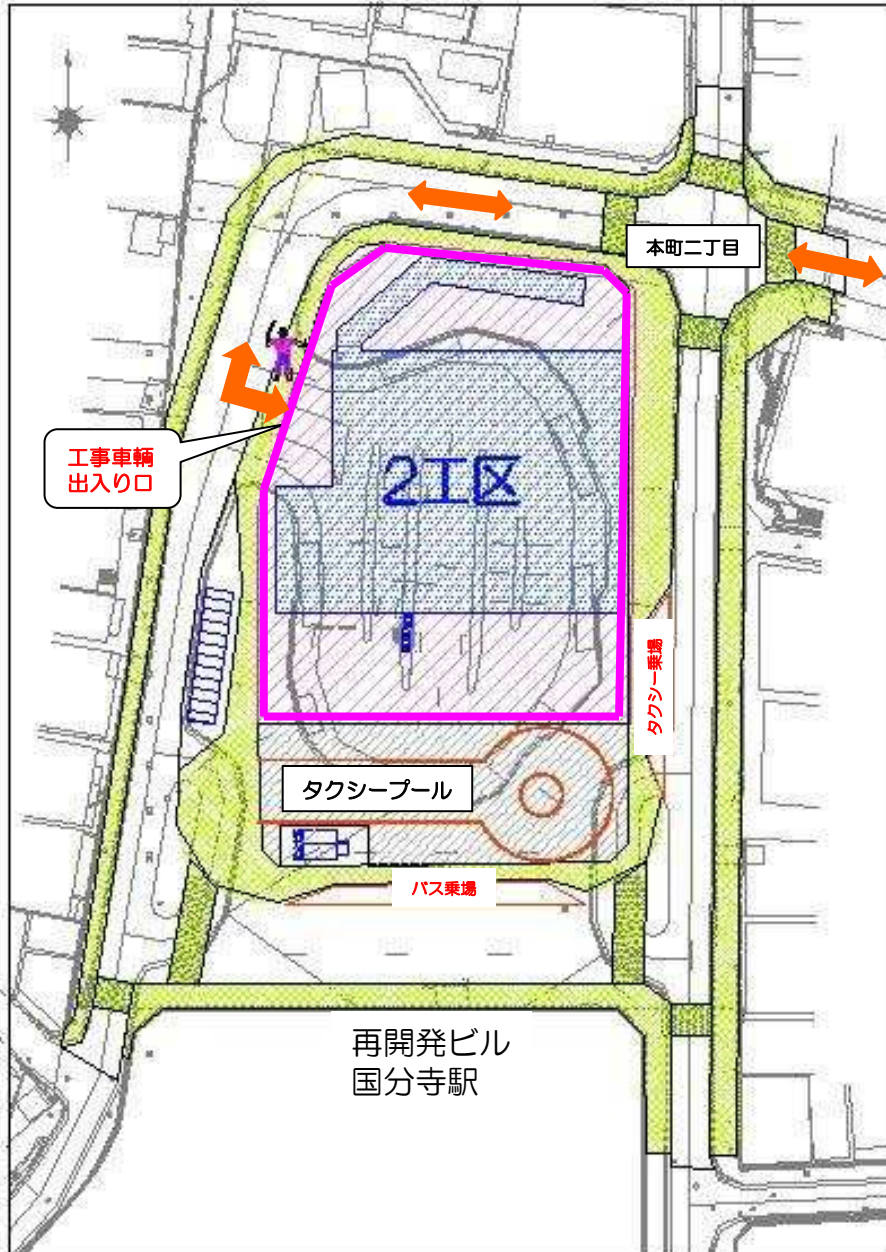

地域への情報

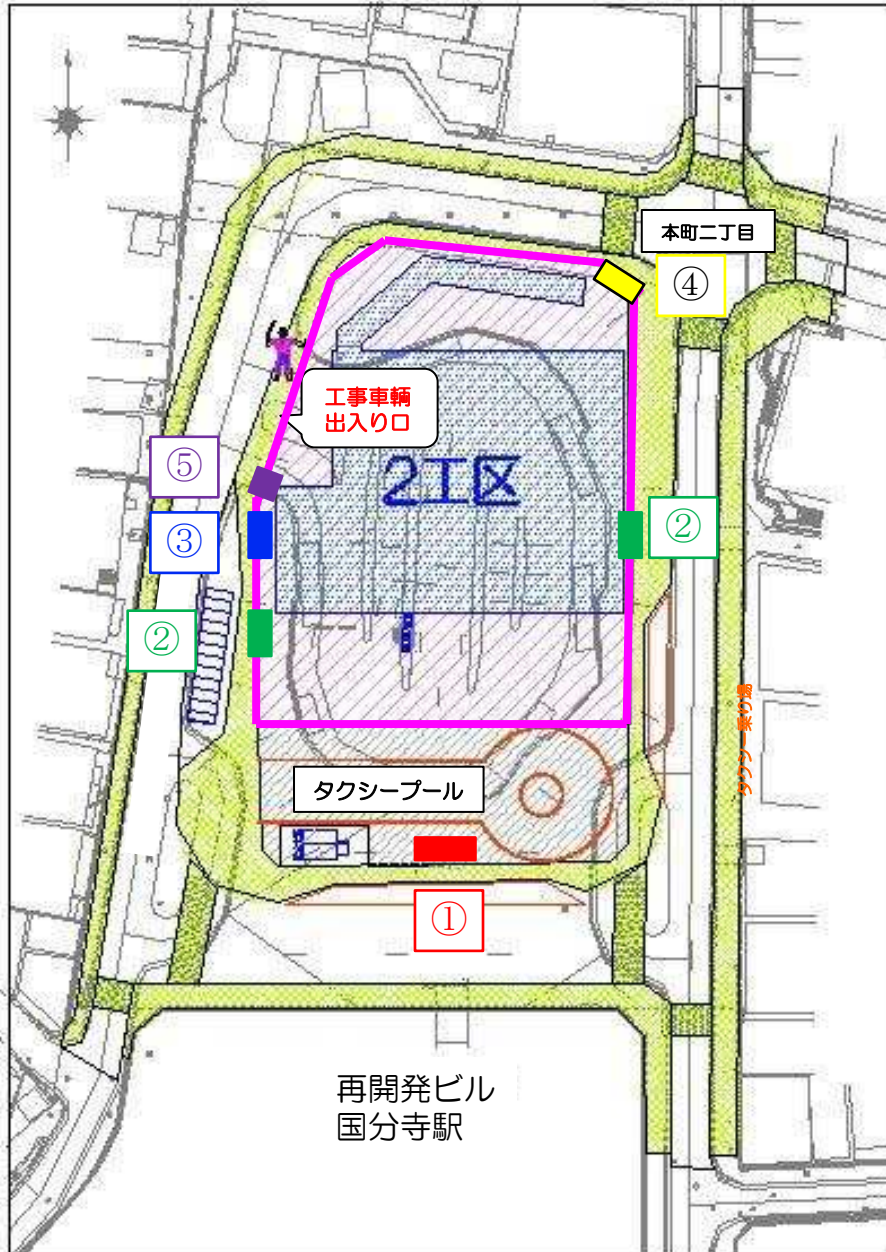

① 情報公開センター設置

(市からのお知らせ、当工事進捗写真等掲示)
(月曜日～土曜日10:00～17:00)
(土曜日は作業日のみ)

② デジタルサイネージ

(進捗状況、週間工程ほか)
(6:00～24:00放映)

③ 振動・騒音計設置

(24時間計測表示)

④ 交通広場、地下自転車駐車場

イメージスケッチ図
(W2.7m×H1.8m)

⑤ 週間工程表掲示

安全対策


- ① 仮囲いコーナー部には歩行者の対面接触を防止するため、**クリアパネル**を使用し前方の視界を確保します。
- ② 工事用車両入口には**交通誘導員を配置**し、歩行者及び一般車を優先し接触事故の防止に努めます。
- ③ 夜間施工における、全面通行止め・片側交互通行については、事前に**予告看板**の設置と近隣住民のみなさまへ**お知らせを配布**し、周知を図ります。
また、各所に**交通誘導員を配置**し一般車及び歩行者に迂回をお願いします。



(仮称) 国分寺駅北口地下自転車駐車場整備工事

【スケジュール】

全体工期：2017年11月1日 ~ 2019年7月31日 (2019年10月31日) 3ヶ月延伸

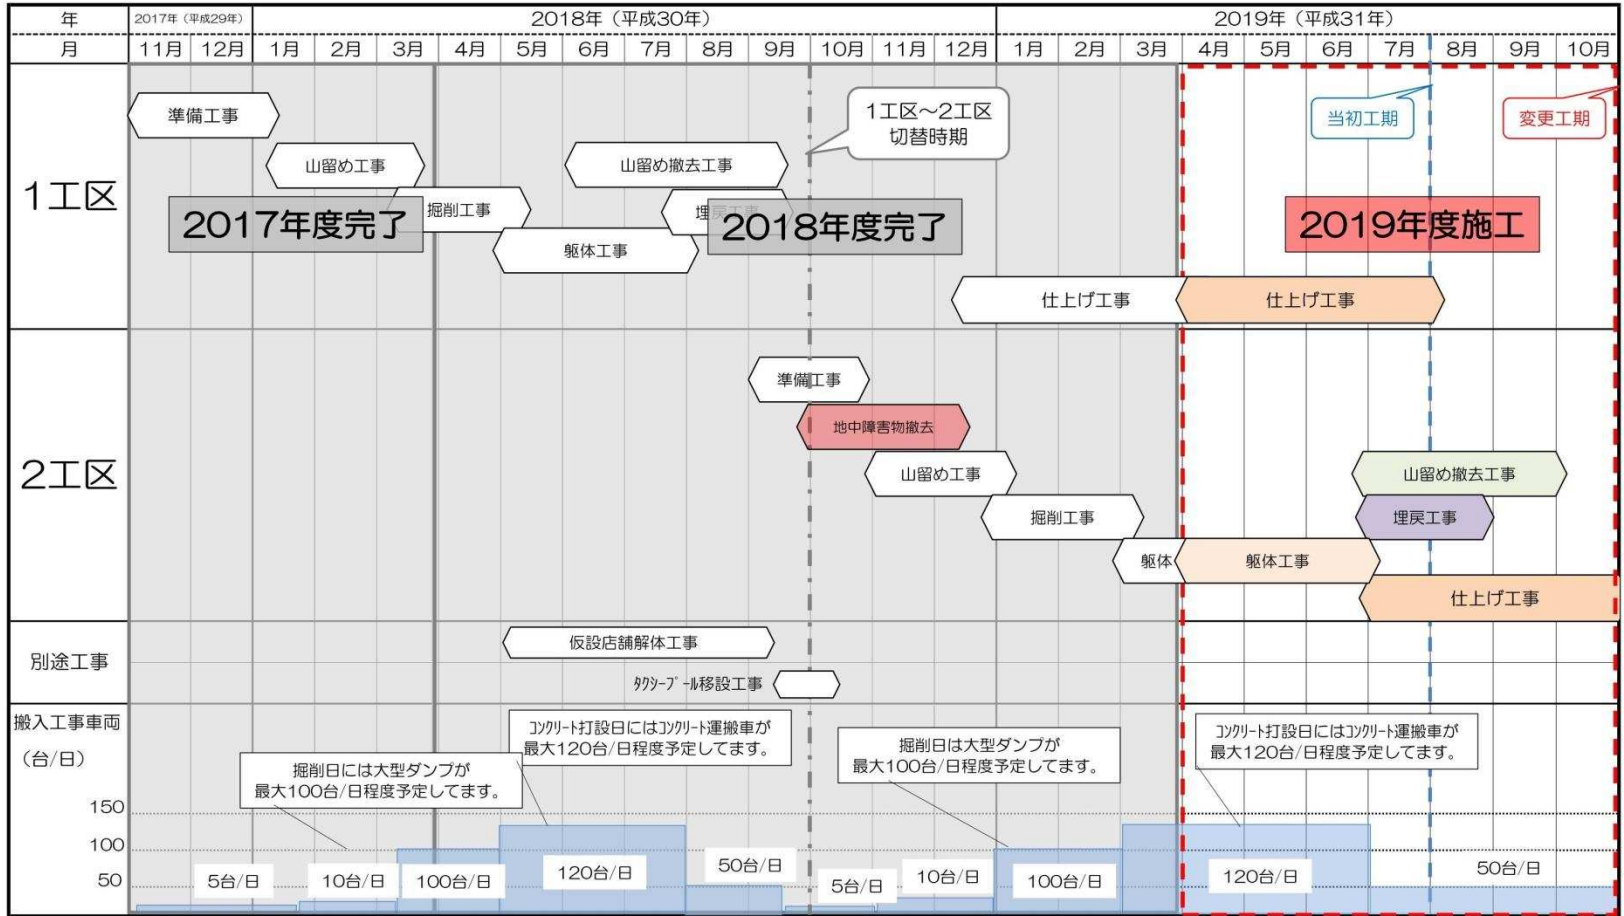

※各工事は工事間調整等により変更する場合があります。
