


平成26年1月14日～平成26年9月中旬(予定)


西側通路を閉鎖し迂回路を設置し、西側工区の改修工事に着手

※現在のバス・タクシー乗降場所は、平成26年7月頃に再開発事業区域内の北側に移動します。

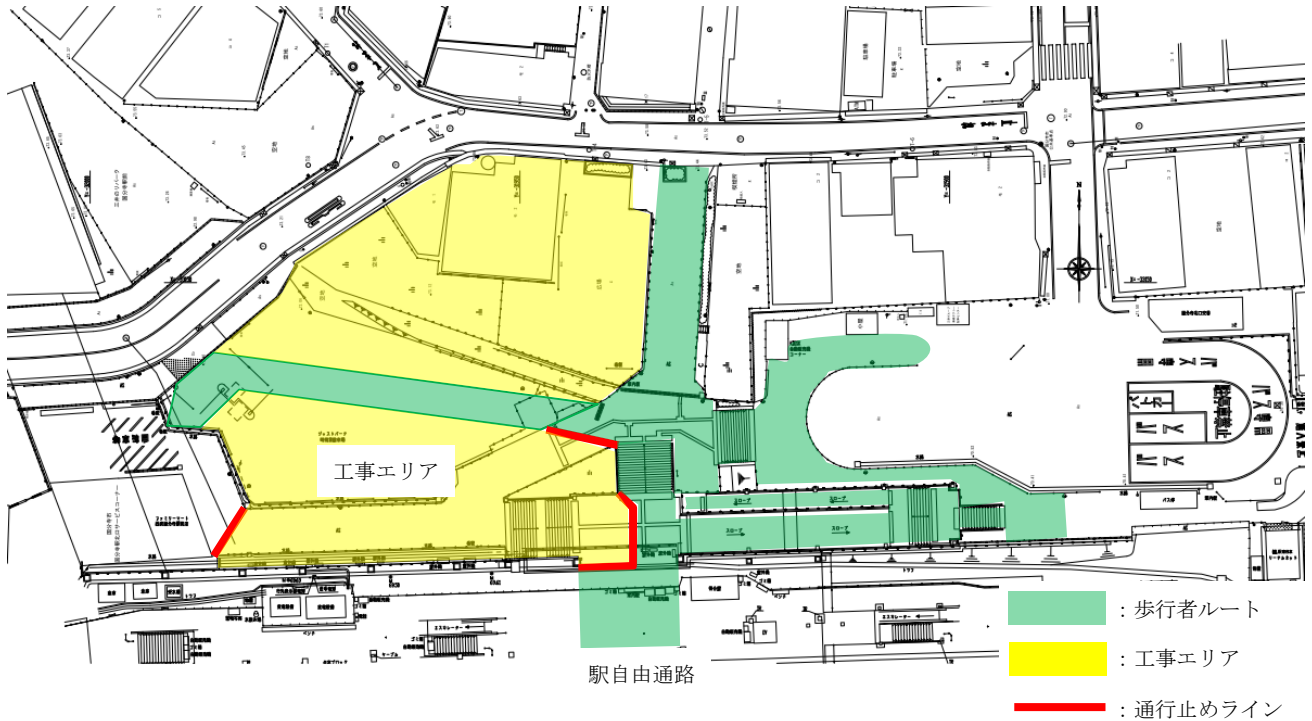


平成26年9月中旬～平成26年10月下旬(予定)

西側工事完了後西側通路を開放します。 駅自由通路で西側ルートと東・北側ルートが分かります。

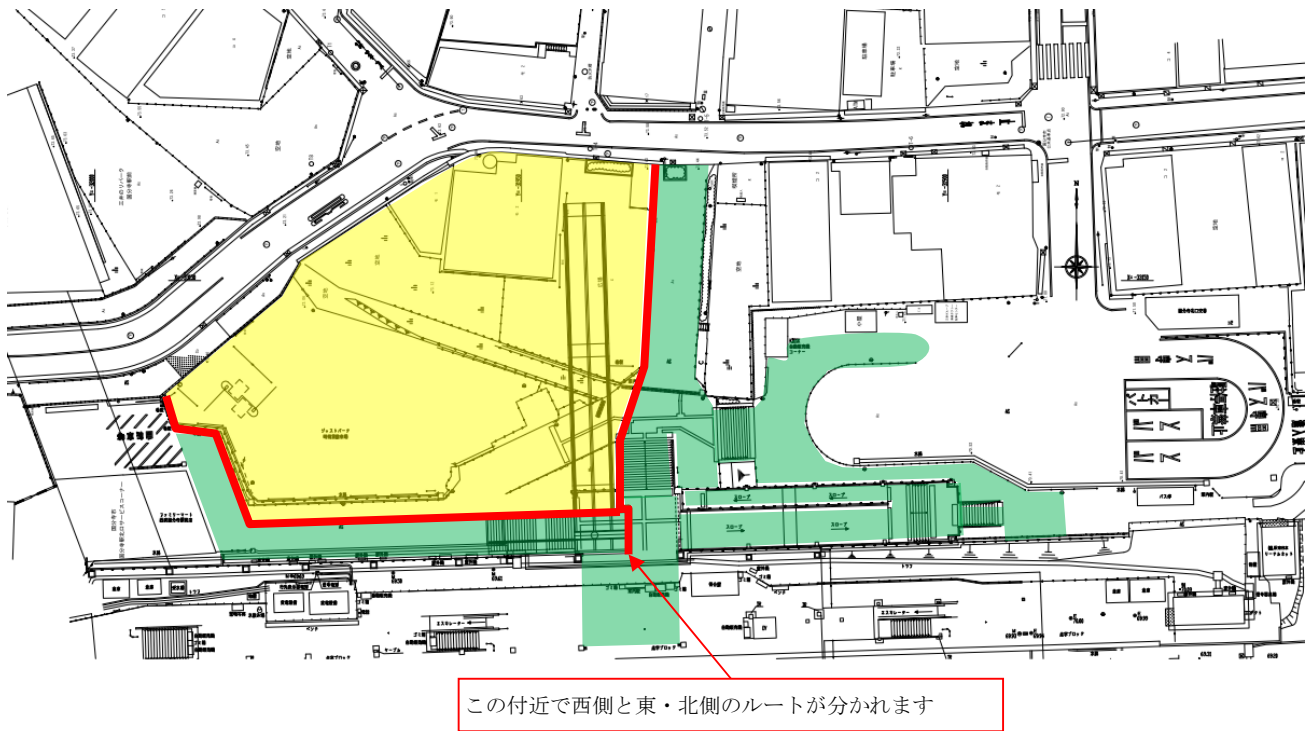


平成26年10月下旬～平成27年3月(予定)

北側ルートを仮設スロープにて新設し歩行者を切替え、東側工区の工事に着手

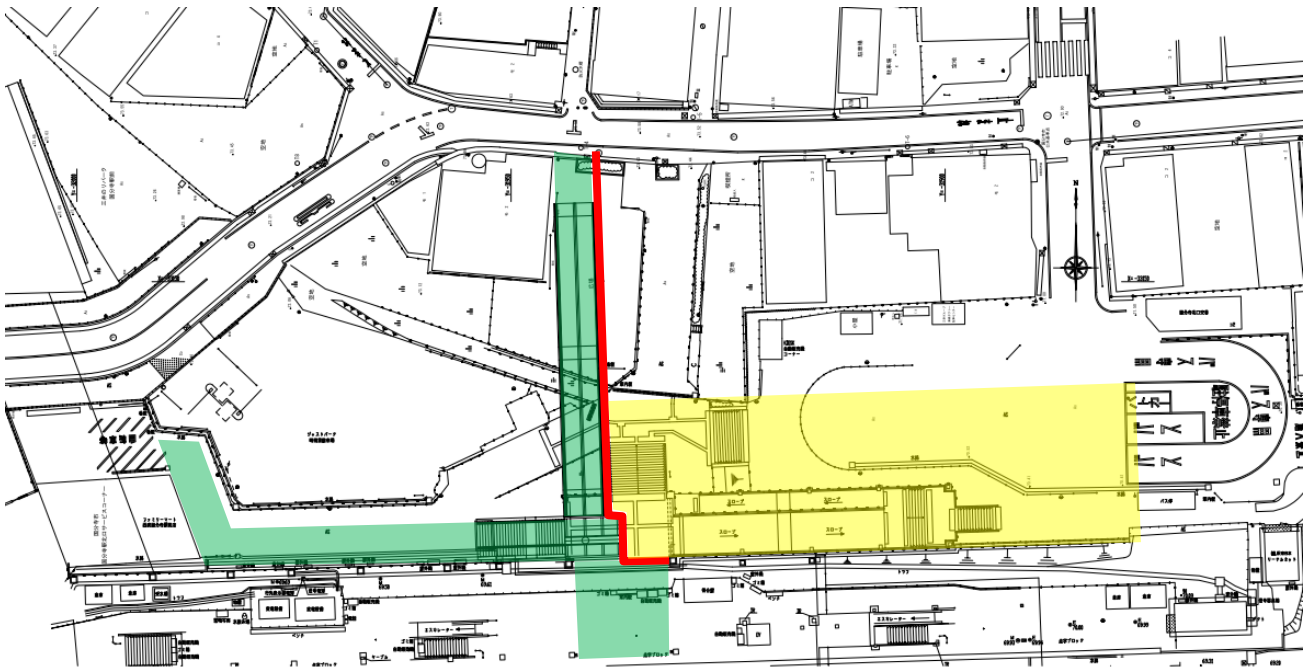

近接工事終了(平成27年3月予定)

※しばらくの間 歩行者通路は下図の通りとなります。

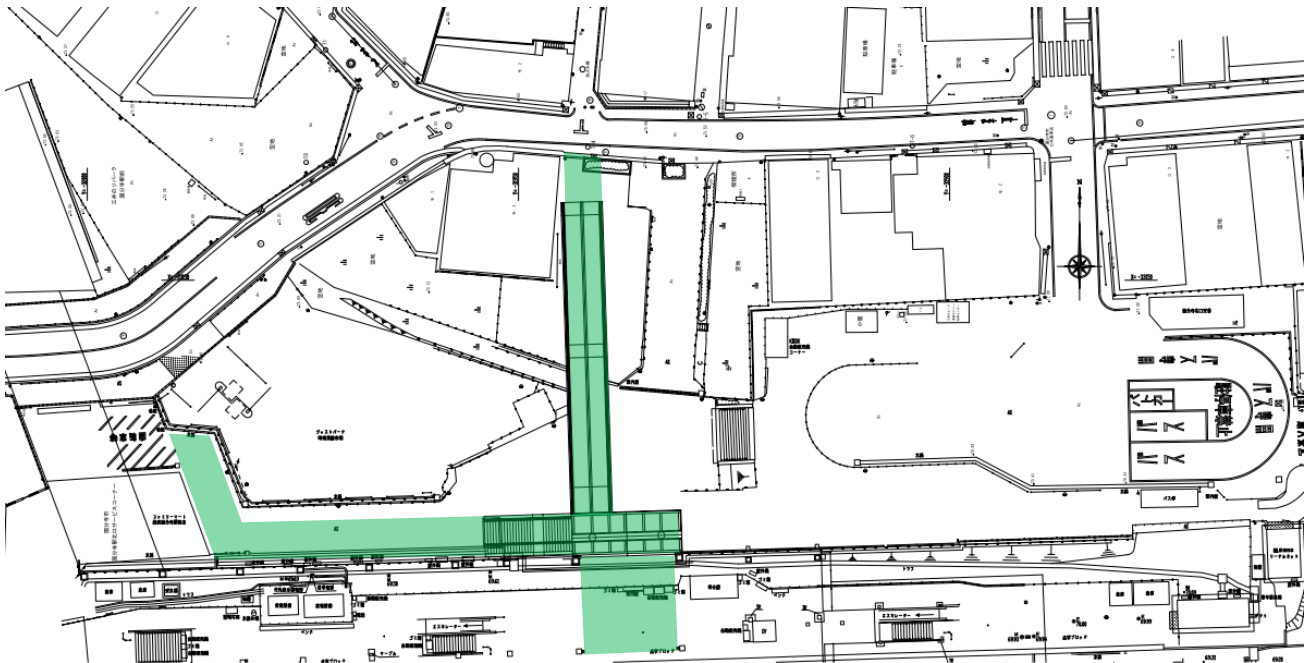

以上、近接工事に伴う国分寺駅への歩行者ルートは工事進捗により図示したとおりに変更していきます。なお、歩行者ルートの変更の詳細は、変更の段階に応じて事前に、現地等に掲示してお知らせしていきます。
