

国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区

第一種市街地再開発事業の進捗及び交通広場修景計画の説明会

【日 時】平成31年3月1日（金）午後2時～

平成31年3月2日（土）午前10時～


※両日とも同一内容

【場 所】リオンホール（cocobunji WEST 5階）

【内 容】

1. 挨拶
2. 事業スケジュールについて
3. 平成31年度の工事概要について
4. 修景計画について
5. 質疑応答

施設の配置計画

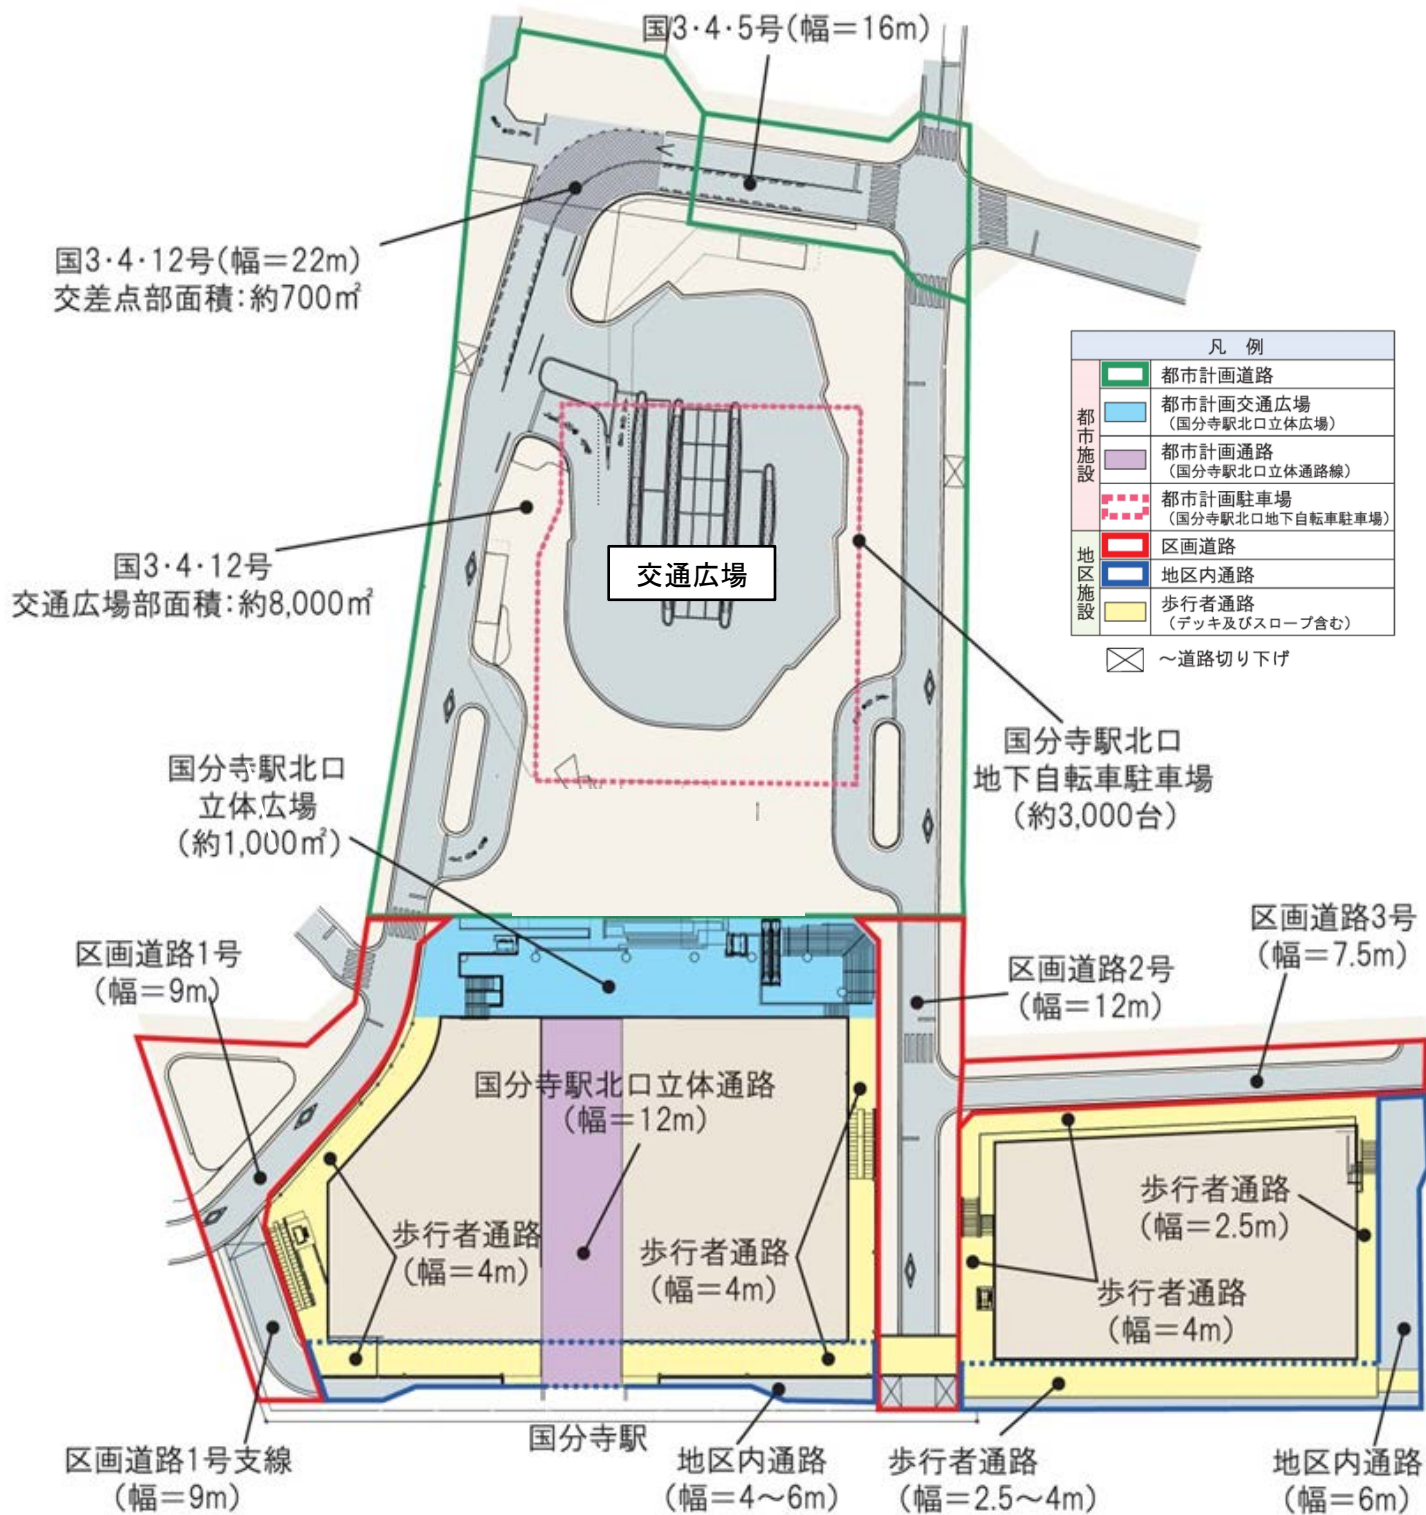

※この配置計画図は公共施設等の配置の概略を示したものです。今後変更になる場合があります。

平成31年3月 国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業 事業スケジュール(予定)

工 事	平成 27 年度				平成 28 年度				平成 29 年度				平成 30 年度				平成 31 年度											
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1								
特記事項	再開発ビル工事着工								仮設タクシープール切替 仮設バス停切替				再開発ビル完成				仮設タクシープール切替				仮設バス乗場・タクシープール切替 地下自転車駐車場完成				仮設バス・タクシー乗場切替 公共施設完成			
公共施設工事																	街築				歩道・修景施設							
									引込・関係管工事								歩道・車道舗装											
区画道路等	インフラ支障移設等工事				インフラ支障移設等工事								NTT埋設管路敷設換え工事															
再開発ビル工事									外構工事8月～3月																			
地下自転車駐車場工事																												
その他の工事					タクシープール移設工事				バス停移設工事 仮設店舗解体工事				仮設店舗解体工事				交番新築・仮設交番解体工事											
									鉄道敷地改修工事				タクシープール設置工事															
国3・4・12号線 (交通広場～ 熊野神社通り)																	用地取得に関わる手続き, 設計等											

工事概要全体図(予定) (平成31年度)



【交通広場内工事】

①交通広場内工事
(平成31年6月～平成32年3月)

②区画道路整備工事
(平成31年6月～平成32年2月)

③仮設バス停移設
(平成31年冬頃)

④仮設タクシー乗り場移設
(平成31年冬頃)

※③の仮設バス停移設と④の仮設タクシー乗り場移設の
時期・移設場所については、工事業者・関係企業等との
調整の上、事前にお知らせいたします。

⑥仮設交番解体工事

②区画道路
整備工事

⑤地下自転車
駐車場工事

①交通広場内
工事

④仮設タクシー乗り場移設

③仮設バス停移設

⑥交番新築工事

cocobunji
WEST

cocobunji
EAST

国分寺駅

本町二丁目交差点

駅前通り

大学通り

【地下自転車駐車場工事】

⑤地下自転車駐車場工事
(平成29年11月～平成31年10月)

【その他関連工事】

⑥交番新築・仮設交番解体工事
(平成31年4月～平成32年1月)

※工事の進捗により変更することがあります。
